


御近隣の皆様へ

練馬光が丘病院改築工事について

- ・連絡先 株式会社フジタ東京支店 建築工事部 現場代理人 後藤
TEL 03-5309-2474 携帯 080-5903-8512
- ・説明会 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、御近隣の皆様を招聘しての説明会は中止とさせていただきます。現場事務所の体制が整い次第、改めて御連絡致します。
- ・作業時間 原則8:00~18:00（整理清掃時間等含む）
- ・作業日 日・祝日を休日とします。但し、騒音・振動が伴わない作業及び、緊急で行う必要がある作業は休日又は時間外に実施させて頂く場合もあります。
- ・車両誘導 誘導員をゲート前に配置するとともに、通学時間や人通りが多い時間を避けて資材の搬出入を行います。

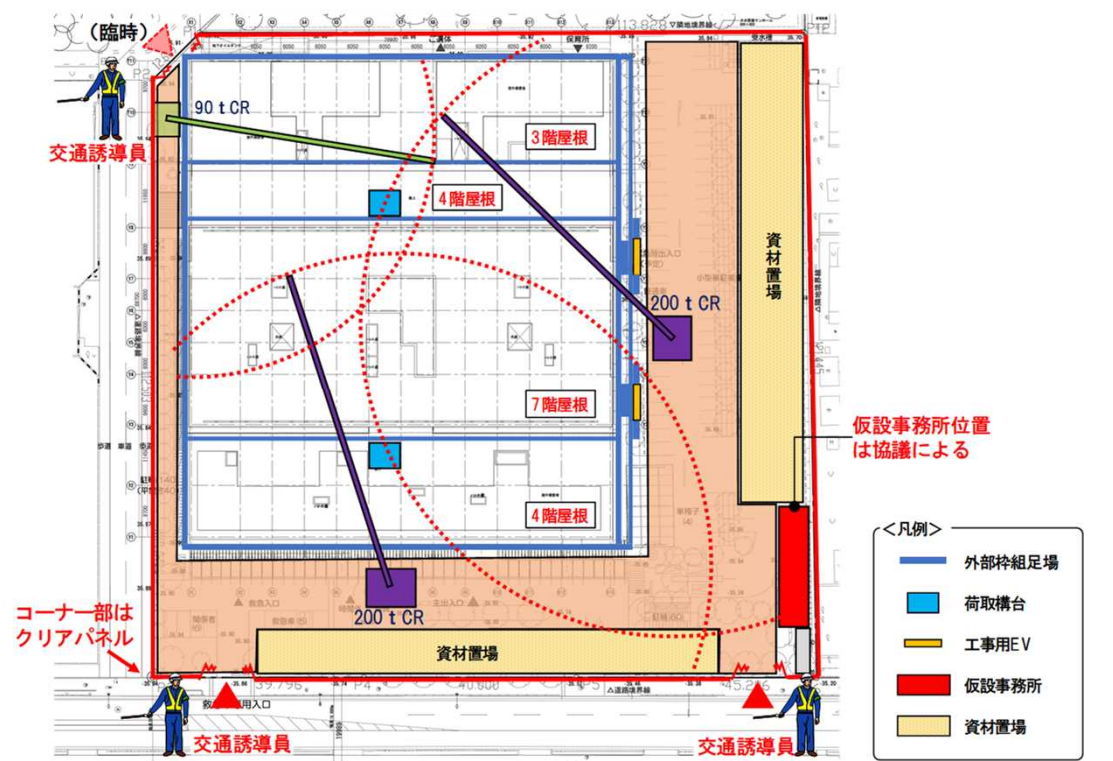

	2020年												2021年												2022年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			
準備工事	仮囲い・仮設事務所・測量												足場・工事用エレベータ設置																		
仮設工事													外部足場・工事用エレベーター設置期間																		
山留工事	山留工事																														
基礎工事	杭工事																														
土工事	先行掘削												掘削① 掘削②																		
躯体工事													基礎躯体工事												コンクリート打設						
鉄骨工事													1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 塔屋												鉄骨工事						
仕上げ工事	<準備工時日程> 仮囲い設置：5月11日~5月16日 通路整備：5月11日~5月16日 起工式準備：5月7日~5月11日 起工式：5月12日 仮設事務所設置：5月13日~5月23日 歩道切り下げ工事：5月21日~5月30日 試掘・現地確認：5月25日~5月30日																								内外装仕上げ工事						
電気・設備工事													電気・設備工事																		
外構工事																									外構工事						
各種検査																									西側区道改修工事						
騒音	平均 70~80dB (目安：掃除機、騒々しい街頭~地下鉄の車内、ピアノの音)												平均 60~70dB (目安：普通の会話、チャイム~掃除機、騒々しい街頭)												連動試験・各種検査						
振動	振動：中												振動：小 ※コンクリート・鉄骨工事・外構工事期間中は												試運転調整						
